

ОТЧЁТ ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ И КОМПЛЕКТАЦИИ

Объект: ЖК ЛИЦА ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Адрес: г. Москва, ул. Авиаконструктора Сухого, д. 2, корп.1, [REDACTED]

дата: 27.02.2020

ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Привезли краску, докупили по банке каждого цвета.

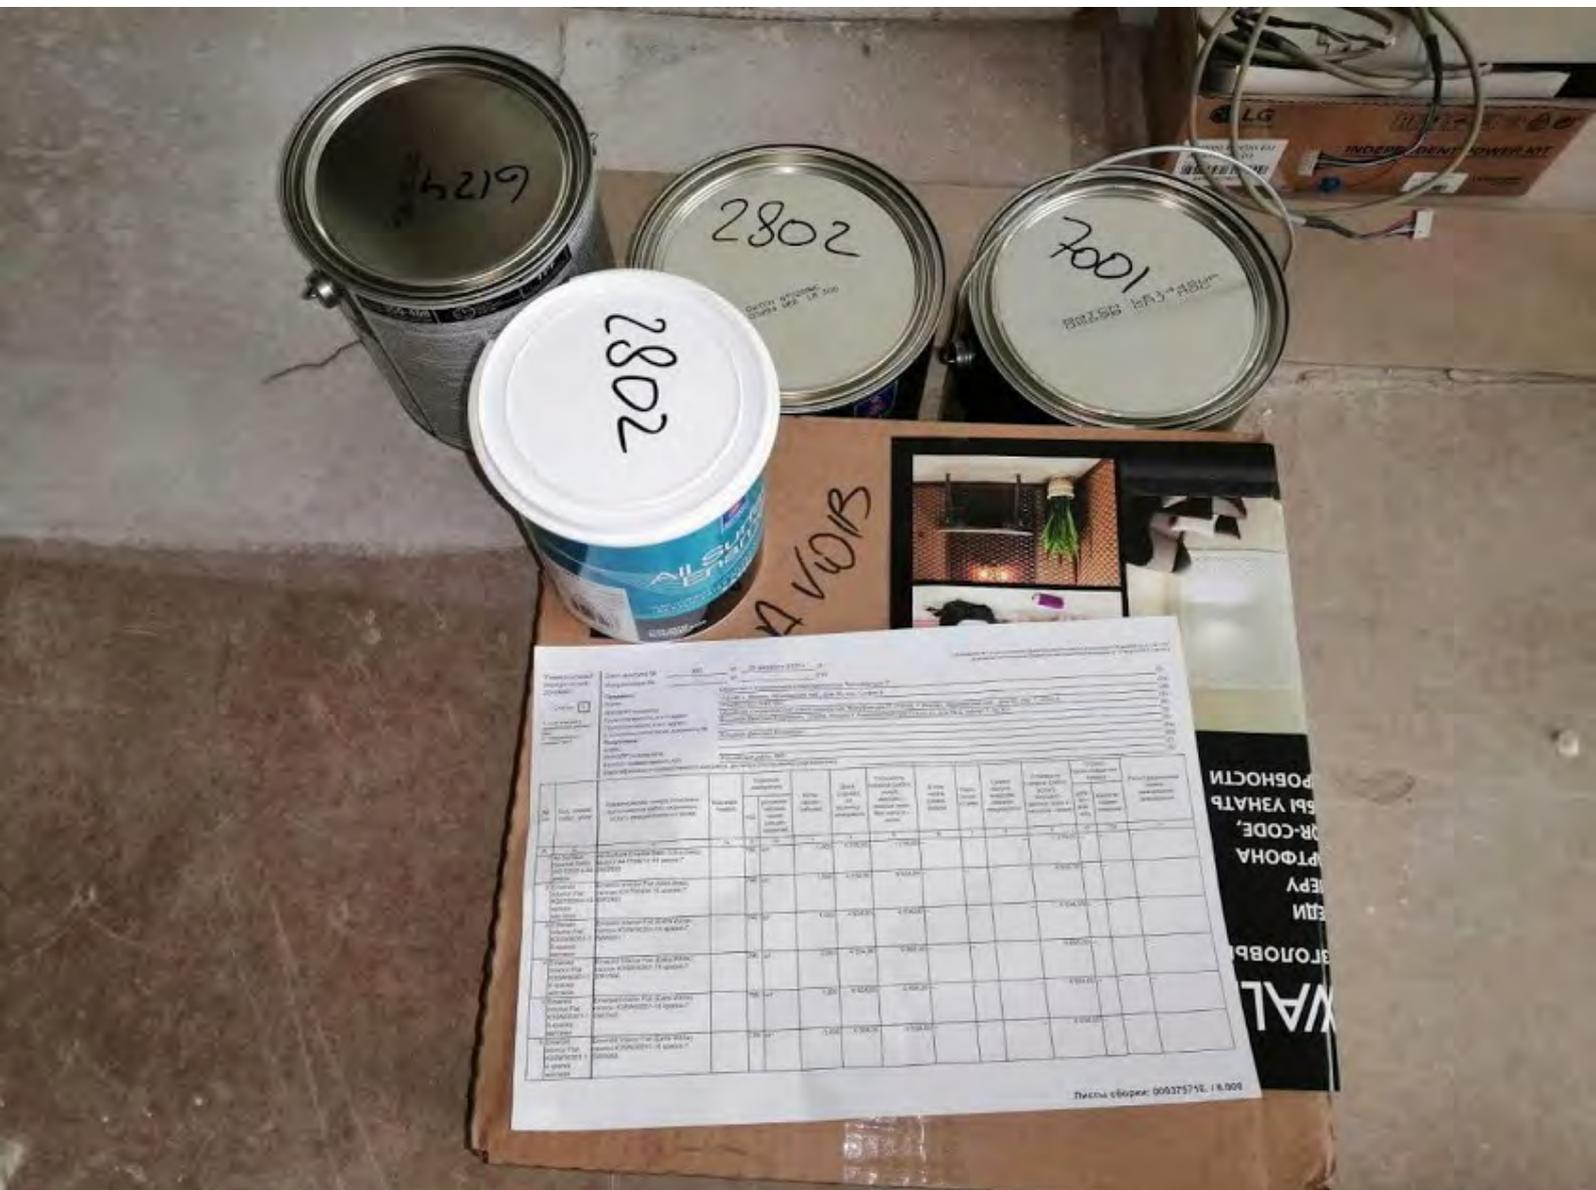


ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Прихожая.

Определил цвет полосы на панели за крючками.

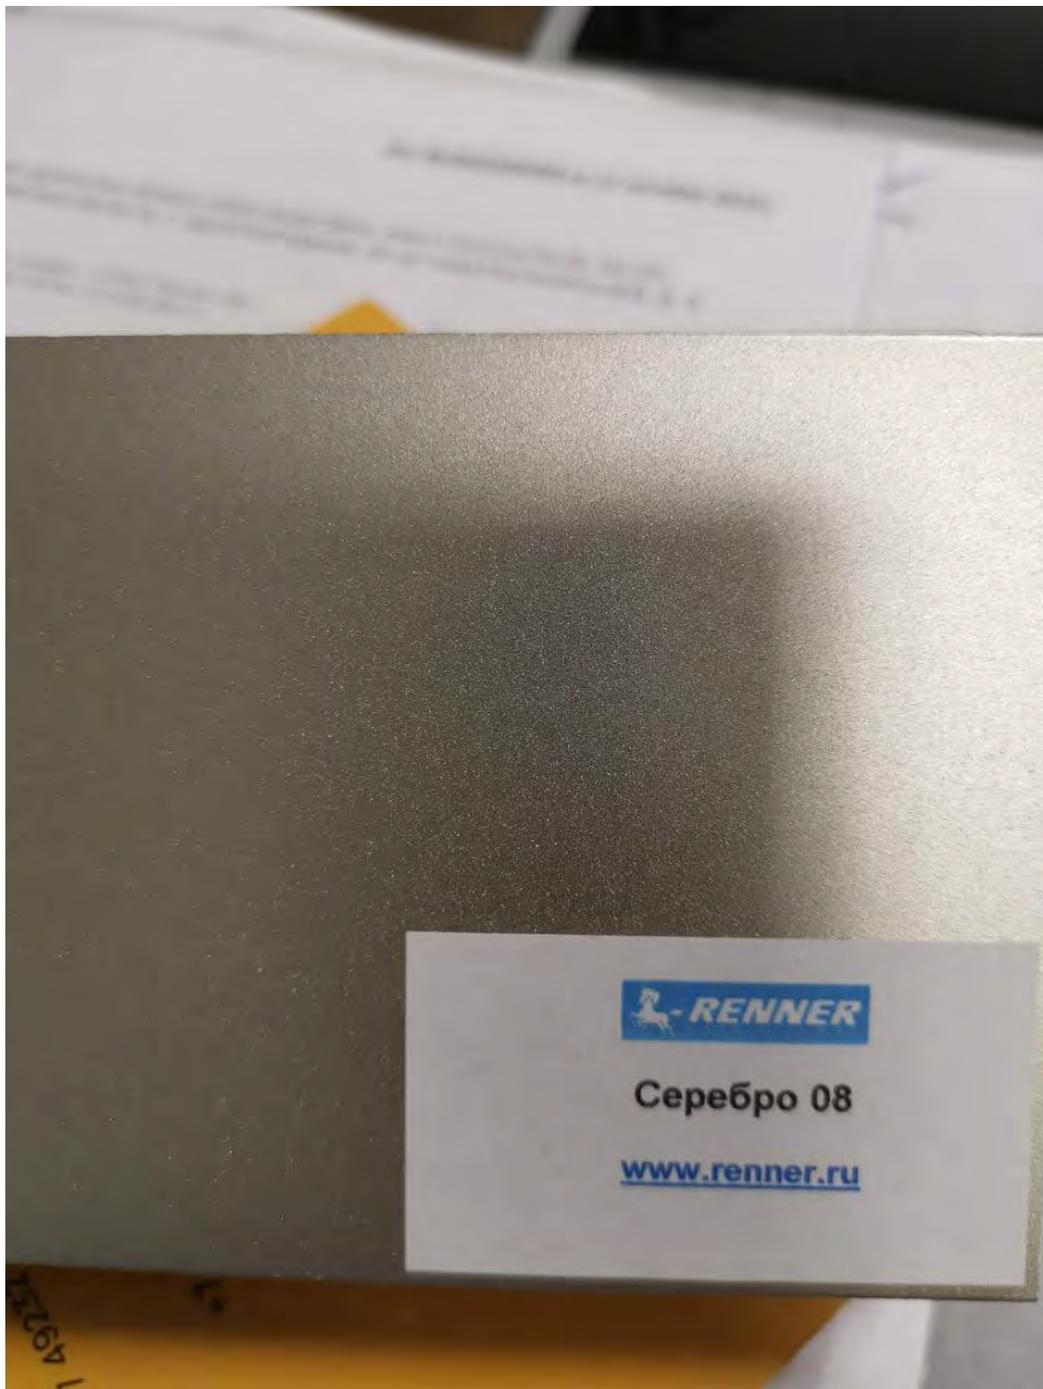


ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Гардеробная 1.

Полка смонтирована не в горизонте и стык неровный.



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Кабинет.
Розеточный блок не в горизонте



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Кабинет.
Розеточные блоки не в горизонте



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Кабинет.
Боковина ниши завалена



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Доставили диваны.
Упаковка не повреждена.



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Кухня. Гостиная.
Выбрали кварцит 5141

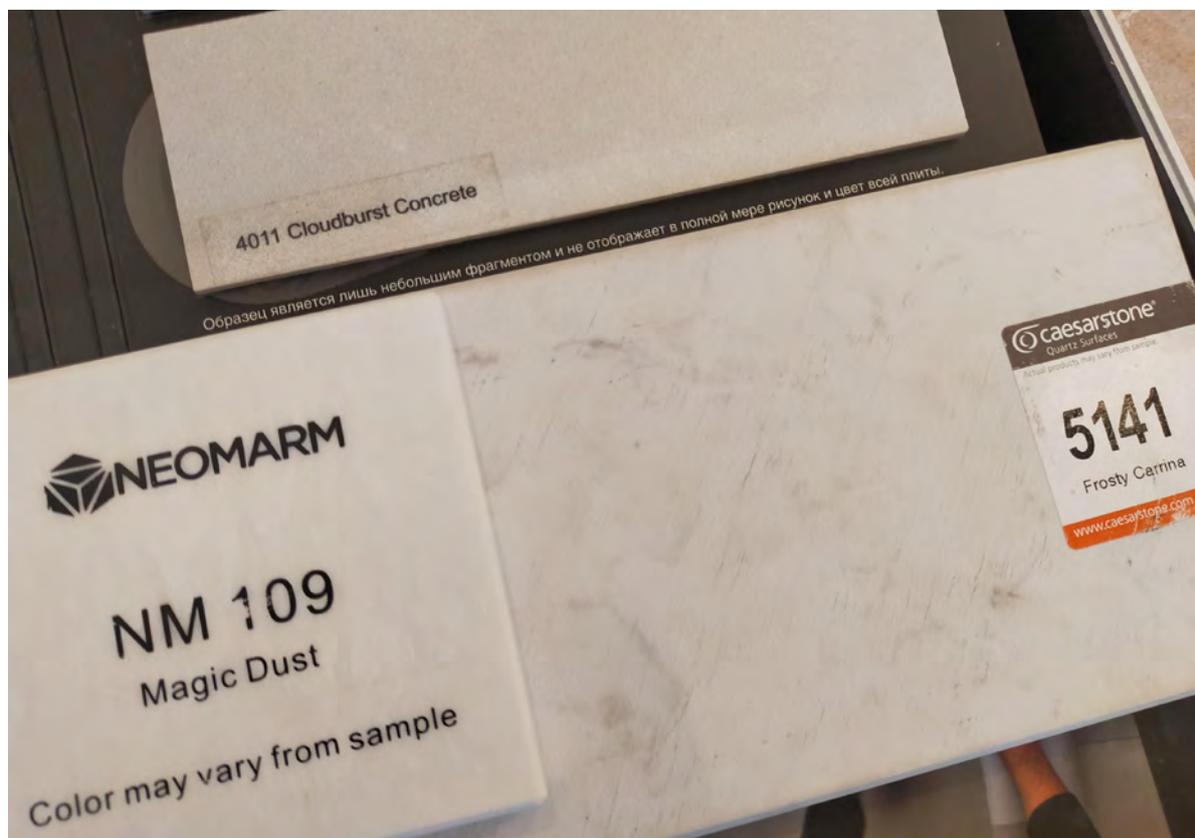


ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Кухня.

Рекомендация: собрать всю кухню но пока не вешать верхние шкафчики. Так можно смонтировать столешницу без стыков.

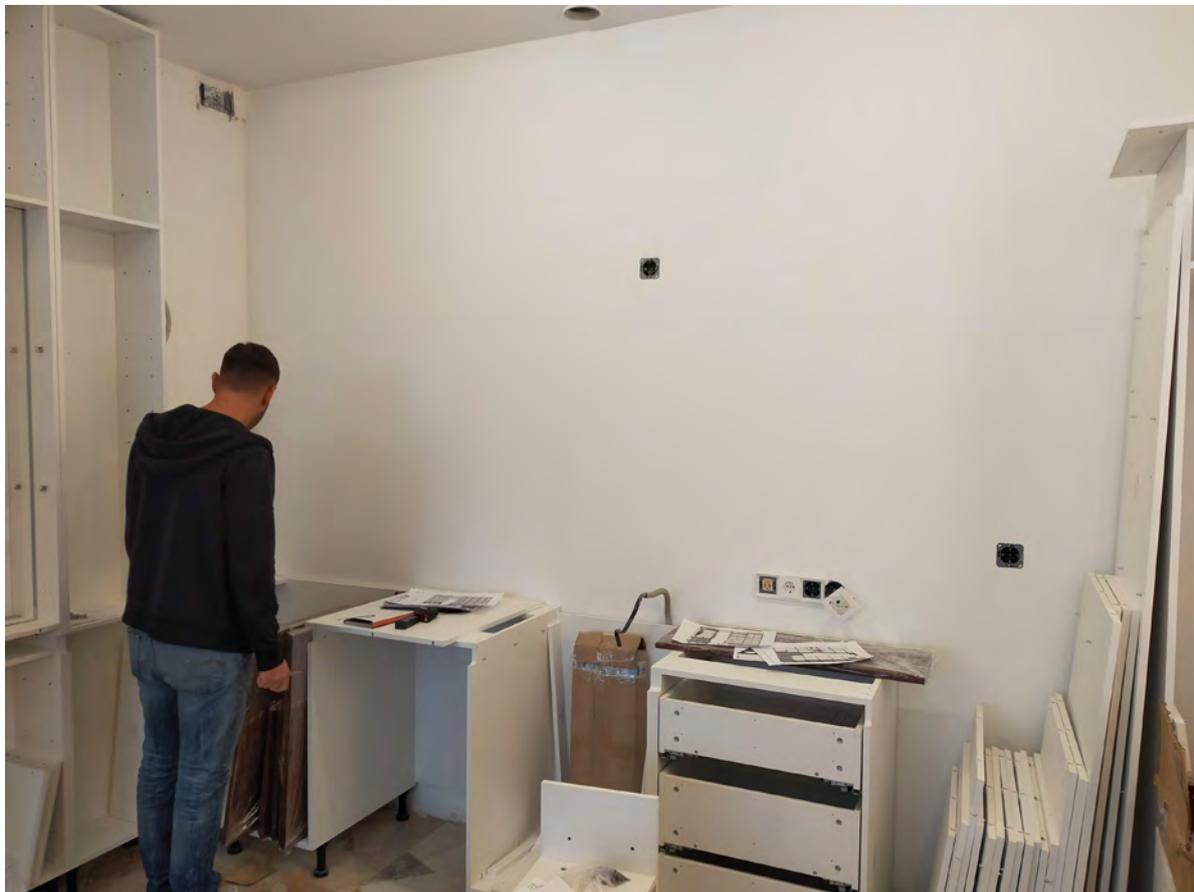


ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Прихожая.
Установили черный домофон вместо белого.

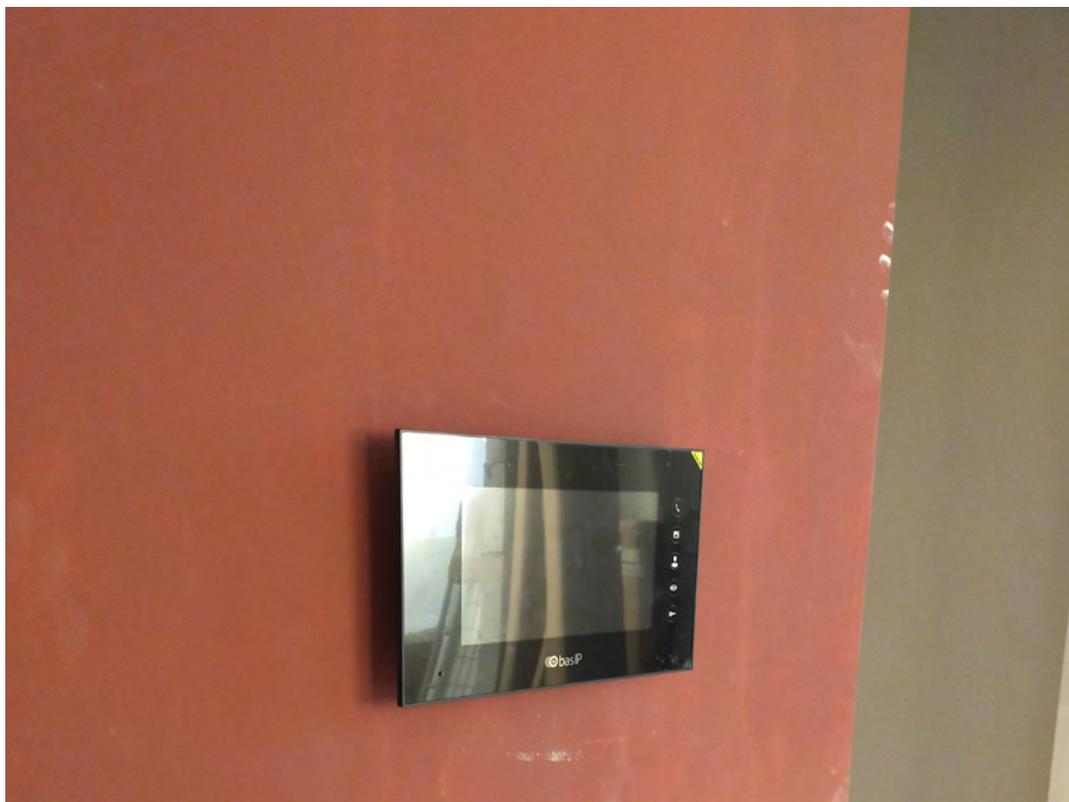


ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Коридор.

Установили черную вызывную панель вместо серебрянной



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

По всем окнам трескаются или треснут стыки рамы и откоса.
Рекомендация: просиликонить и закрасить.



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Кабинет.

Перенести провод для карниза согласно полученной схеме.



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Спальня.

Убрать 3 провода. Перенести провод подвеса. Перезаказать 3 зеркала.



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Гардеробная.
На полке заводской дефект. Заменить.



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Доставили кровать.
Упаковка не повреждена.



ОТЧЁТ ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ И КОМПЛЕКТАЦИИ

ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Оплатил за доставку и подъём кровати.
4000р

Доставочный лист ИП «Колесников»

№ заказа: A.2658/3406

Дата доставки 27.02.2020

Время доставки _____

Адрес:
город Москва улица Владимирская Суслово
дом 2 корпус 1 квартира 307 подъезд 3
этаж 14 код _____ грузовой лифт Семь

Контактное лицо: тел. 8-9 26 - 155 - 53 - 73
Александр
тел. 8-9 _____

Акт приёма заказа.

Я (ФИО полностью) Смирнов А.А.

Подтверждаю, что заказанный мною товар Кровать «Алекс»

Изготовленный фабрикой мягкой мебели «VOSART» надлежащего качества. Товар проверен, получен полностью (в соответствии договору № A.2658) ✓

претензий по качеству и количеству не имею ✓

Принято без вскрытия упаковки. Упаковка не нарушена ✓

Доставил Александр

Стоимость доставки: 2500р

Стоимость подъёма, заноса: 1500р

Стоимость сборки: 1000р

Доплата по заказу: _____

ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Душевая.

Повесили зеркало. Получилось чуть выше нормы.

Принять, т.к. заказчик высокий.

Подсветка тумбы постоянно горит.

Заказать и установить датчик на открывание.

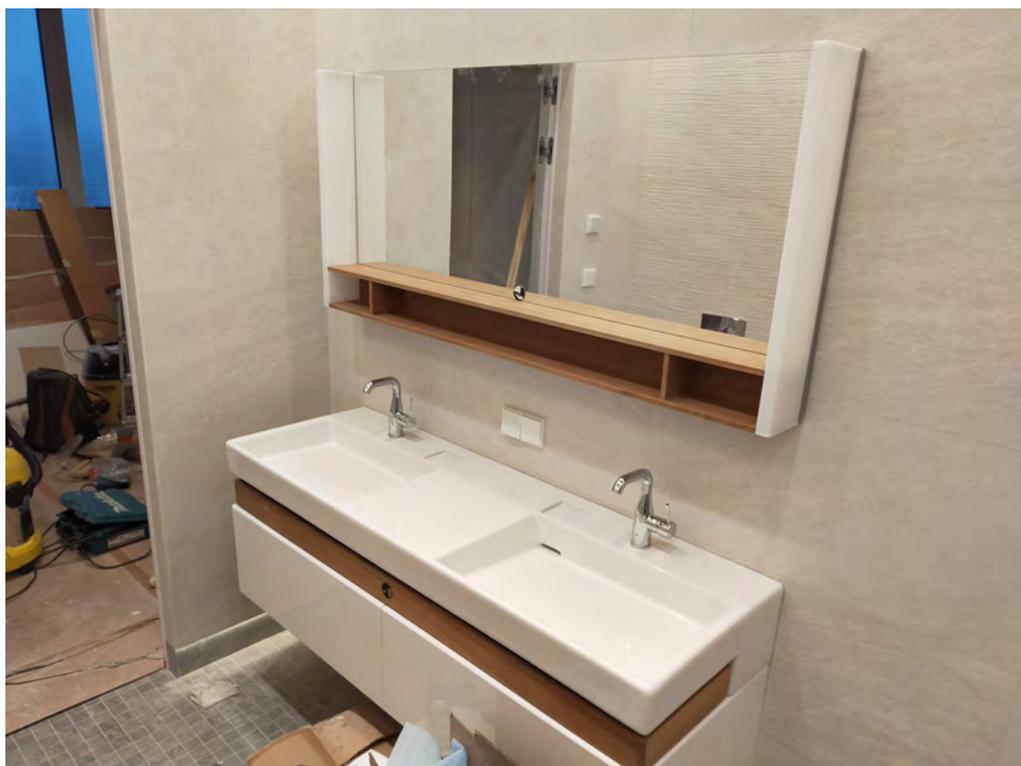


ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Спальня.

Поставить стойку стеллажа по линии зеркала.



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Кухня.

Привезли технику на кухню.
Упаковка не повреждена



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Кухня.

Привезли технику на кухню.

Упаковка не повреждена



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Кабинет
Повторная покраска стен



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Спальня.

Разная шершавость столешницы и стоек в стеллаже



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

СУ Гостевой.

Поставить в проектное положение профиль бра.



ФОТО И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАБОТ

Кухня.

Сделать выпил в стойке кухни. Для удобства монтажа панели фартука

